

château en vue !

Chers visiteurs virtuels,

Nos charpentiers ont posé les deux premières fermes de la charpente du logis. Cet été, les visiteurs ont été marqués par l'avancée de la construction et pourtant, pour nous, la saison est loin d'être terminée. En automne, alors que le chantier devient touristiquement plus calme, nous nous concentrons sur la construction et le rythme est soutenu : 9 fermes à monter sur la chambre du logis, le lattis de la charpente à fixer et la couverture en tuiles à poser avant l'hiver ! C'est aussi terminer la courtine nord, monter les murs pignons et assembler les dernières fenêtres géminées du logis.

Au coeur de la forêt de Guédelon, ouvriers et bâtisseurs construisent ensemble un château fort !

Merci à tous.

Maryline Martin



Le suivi des travaux



Sur le 1er étage du logis seigneurial

Côté chambre : Les travaux de ce mois d'août ont porté principalement sur l'élévation du mur pignon (à l'Est) afin d'assurer la hauteur nécessaire à la mise en place des fermes de charpente. Les premières pierres de corniche ont été maçonnées en surplomb de la façade sud. Les premiers chaperons en calcaire de la rive de toit ont été posés.



pierres de corniche



chaperons de la rive de toit

3^{ème} cuisson de tuiles de la saison

Celle-ci s'est déroulée le dimanche 24 août avec succès puisque nous sommes parvenus à un résultat de 95 % de tuiles correctement cuites. Quelques modifications avaient été préalablement apportées au four de cuisson. Nous avons également tenté de cuire à nouveau des tuiles qui n'avaient pas été assez cuites lors de la dernière cuisson : cela s'avère inutile !


Prochaine cuisson : **dimanche 5 octobre** si les prévisions météo sont toujours satisfaisantes.

Côté aula : Le mur de courtine nord a été élevé de plus d'1m ainsi que le mur pignon ouest. Les travaux ont repris également sur la fenêtre géminée du pignon.

Les premières fermes de charpente sont posées

Le **14 août** après-midi, les deux premières fermes de la charpente du logis ont été transportées, levées et assemblées au dessus de la chambre.

Les éléments séparés : chevrons, entrails, faux-entrails ont été montés par le grand degré au niveau du plancher de la *aula*.

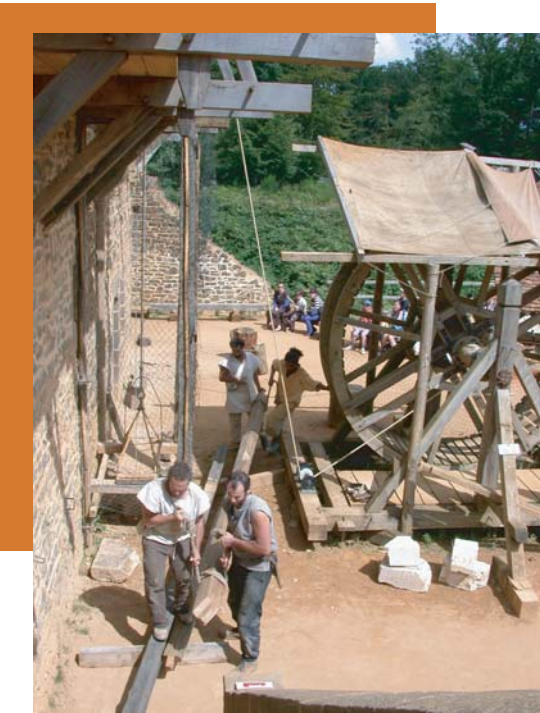


Transport d'un chevron par le grand degré (grand escalier extérieur)

Puis ils ont été hissés au dessus de la chambre.

Une fois tous les éléments parvenus sur le plancher provisoire de la chambre, les charpentiers ont assemblé les fermes.

Ces deux fermes espacées d'environ 50 cm d'axe en axe, vont être noyées dans les maçonneries du mur pignon (côté Est) du logis afin de solidariser l'ensemble.

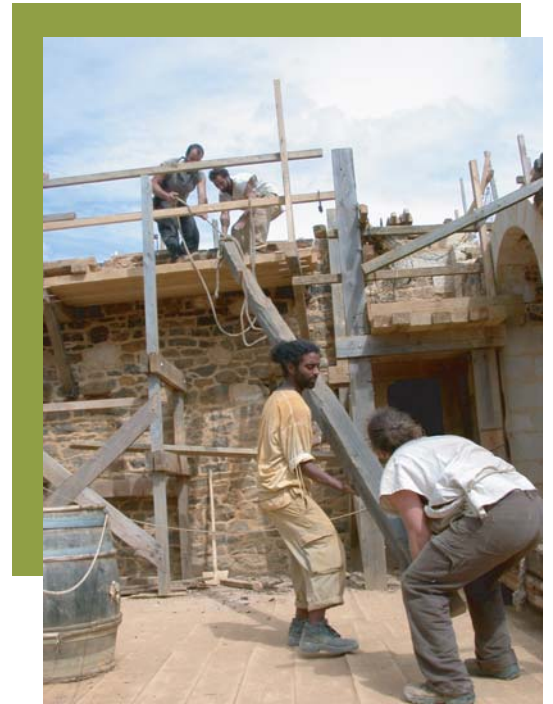

Le chevron est hissé au dessus de la chambre



Les éléments de la charpente sont assemblés avant d'être levés à la verticale

Le triangle des fermes permet de guider les maçons dans l'élévation du mur pignon.



La 2^{ème} ferme est levée

Prochaine étape à partir du 4 octobre

Les ouvriers lèveront les **9 fermes** de la chambre, sur les 47 que comptera le logis seigneurial. Cette étape se déroulera sur plusieurs jours. Ensuite, les lattes en chêne fendues seront clouées afin d'attaquer la pose des tuiles et d'assurer la mise hors d'eau de cette partie du bâtiment.

**N'hésitez pas à venir assister
à ce moment unique !**



Maçonnerie du mur pignon (les trous apparents dans la maçonnerie sont des trous de boulins qui permettront d'ancrer les échafaudages)
