

château en vue !

Chers visiteurs virtuels,

Le chantier a fermé ses portes le 2 novembre, les ouvriers ont pris leurs congés d'hiver après un automne productif : de jour en jour, les fermes du logis étaient posées et sans que l'on ait eu le temps de profiter de l'esthétique de ces majestueuses pièces de chêne, les charpentiers ont cloué les lattis pour qu'une équipe de couvreurs posent dans la foulée les tuiles du toit de la chambre du logis. Pendant ce temps, les maçons ont posé les dernières fenêtres et la porte de la aula. Etonnant ! Emouvant !

Maryline Martin



Le suivi des travaux



Sur le 1er étage du logis seigneurial

Dans la aula : Les 3 dernières fenêtres géminées en calcaire ont été posées. Celle du pignon ouest se singularise des 4 autres par son **quadrilobe** percé dans le tympan.



pose de la clef sur la fenêtre à quadrilobe.


La porte d'accès à la *aula*, située sur la palier du grand degré, a également été maçonnée en cette fin de saison. Cette porte est maçonnée avec une alternance de pierres

Les ouvrages bicolores

Les choix de construction en pierre de taille ont consisté à panacher indifféremment le grès ferrugineux et le calcaire pour des ouvrages tels que la latrine d'angle de la tour maîtresse, les escaliers, les corniches du logis, la porte de la *aula*...

Leur utilisation est liée à la disponibilité des dimensions de pierres présentes sur le chantier plutôt qu'à la programmation d'un décor bicolore. Il y a donc une hiérarchie des ouvrages, avec en premier lieu les fenêtres géminées ouvragées exclusivement

en calcaire, puis les ouvrages panachés et enfin le moëllonnage des murs tout en grès.

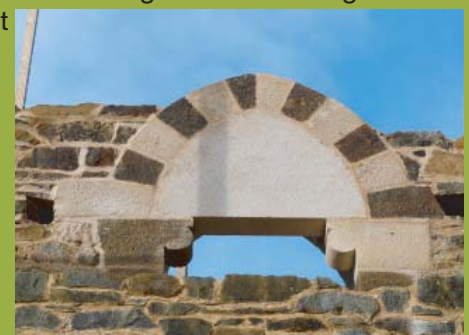

arc brisé de la porte de la *aula*.

Chambre du logis : la charpente est assemblée et le toit est couvert

Tout est allé très vite en cette fin de saison ! Les **9 fermes** restantes ont été transportées, assemblées et levées en 6 jours. Aussitôt, les charpentiers se sont attaqués à poser le **lattis** (= petites lattes de bois destinées à recevoir les tuiles) sur les deux pentes du toit. Le lattis en chêne avait été fendu au préalable par les bûcherons. Pas moins de **900 lattes** de 4 pieds chacune (= 1,20 m) ont été réalisées.



Levage d'une ferme de charpente

Puis, une équipe s'est attachée à poser les **6 000 tuiles** afin d'assurer l'étanchéité de cette salle avant l'hiver. A noter, que toutes ces tuiles ont du être transportées dans un premier temps de la forêt au chantier avec les chevaux, puis elles ont été hissées au niveau du chemin de ronde à l'aide de la cage à écureuil.



Les 9 fermes sont en place au dessus de la chambre

Le lattis en cours de pose



Pose des tuiles

Offrez Guédelon !

Vous qui aimez Guédelon et qui suivez toutes les étapes de construction, faites connaître cette fabuleuse aventure tout en faisant plaisir à votre famille ou à vos proches !

Nous vous proposons d'offrir des billets d'entrée pour Guédelon à des tarifs préférentiels.

Les heureux bénéficiaires recevront leurs billets non datés avant les fêtes.

Bon de commande disponible sur simple demande sur guedelon@guedelon.fr
Paiement uniquement par chèque.

Tarifs : **7 € / adulte** (au lieu de 9 €)
et **5,60 € / enfant** de 5 à 17 ans (au lieu de 7 €)

Commande minimum 2 billets à nous faire parvenir **impérativement avant le 15 décembre 2008.**
