

château en vue !

Chers visiteurs virtuels,

Suivre Guédelon par internet, c'est bien, mais visiter Guédelon, c'est encore mieux depuis ce matin ! Nous avons ouvert un nouveau circuit de visite au plus près de la construction et des bâtisseurs. Dans la tour maîtresse, on monte l'escalier rampant qui nous mène dans la chambre seigneuriale ; on la traverse pour accéder à la toute nouvelle galerie qui débouche sur la courtine Nord ; on emprunte le chemin de ronde couvert puis on redescend dans la grande salle.

Chaque saison est rythmée par une visite et un circuit particulier. Vos précédentes visites sont déjà périmées !

Maryline Martin



Le suivi des travaux



Au 1^{er} étage du logis seigneurial

Sur la grande salle :

- Les maçons poursuivent l'élévation du **mur gouttereau*** Nord de façon à **araser*** ce dernier dans son intégralité. Cette étape est indispensable pour que les charpentiers puissent assembler les **sablières*** et lever en septembre prochain les fermes de charpente.
- Les maçons poursuivent également l'élévation de la pointe du **mur de refend***.

* **mur gouttereau** : mur extérieur d'un édifice recevant la base du versant de la toiture.

* **araser** : rattraper l'horizontalité du mur.

* **sablières** : longues pièces de bois placées sur la maçonnerie et qui permettent d'ancrer les fermes de charpente.

* **mur de refend** : mur porteur séparant deux pièces à l'intérieur d'un bâtiment.



mur gouttereau Nord

chemin
de ronde



Au 1^{er} étage du logis seigneurial (suite)

- Les maçons poursuivent le montage de la cheminée adossée au chemin de ronde (cf *Château en vue !* N°9)
Le **manteau*** est terminé. Le linteau en chêne, composé de trois morceaux, a été taillé par les charpentiers, transporté par le chemin de ronde puis assemblé sur les tablettes en calcaire. Les maçons sont actuellement en train de maçonner les montants de la hotte. Comme pour la cheminée de la chambre contiguë, ces pierres de chaînage sont en calcaire. La hotte sera montée un peu plus tard dans la saison.

* **manteau** : désigne la partie inférieure de la cheminée comprenant les jambages et le linteau.

- **Sur la chambre des invités** : la **souche*** de la cheminée est achevée.

* **souche** : maçonnerie entourant un conduit de cheminée.



maçonnerie de la porte et du couloir menant au chemin de ronde

la souche de la cheminée



Le linteau de la cheminée est transporté dans la grande salle



Le linteau est assemblé sur les tablettes



Les montants en calcaire de la hotte ont commencé à être posés

La base de la souche comporte un **solin** : c'est un joint réalisé avec du mortier qui permet d'assurer l'étanchéité.



le solin



Sur la tour maîtresse

- La porte d'accès à la chambre seigneuriale et celle menant à la latrine de la tour sont terminées.
- Les jambages de la cheminée continuent à être montés.
- La niche de l'**assommoir*** est terminée.

* **assommoir** : conduit placé au dessus d'une porte ou d'un passage et qui permet de laisser tomber des projectiles sur des assaillants.



Sur le chemin de ronde

- Le passage couvert entre la tour maîtresse et le chemin de ronde est terminé. La charpente a été assemblée et les tuiles ont été posées. A partir d'aujourd'hui, vous pouvez emprunter ce passage pour accéder à la grande salle du logis.
- La logette de la latrine est maçonnerie.

Une partie du chemin de ronde est couvert



La tuilerie

Une deuxième cuisson a été réalisée le 21 juillet dernier.

Petit rappel en chiffres :


25 000 tuiles seront nécessaires pour la couverture du logis (20 000 pour le logis + 5 000 pour la couverture du chemin de ronde Nord)

6 000 tuiles moulées, cuites et posées en 2008.

3 000 tuiles moulées et cuites lors de la 1^{ère} cuisson 2009.

2 500 tuiles et 10 faitières moulées et cuites lors de la 2^{ème} cuisson 2009. La prochaine cuisson aura lieu le **6 août** si les conditions climatiques sont satisfaisantes.

Les tuiles dans le four avant le défournement

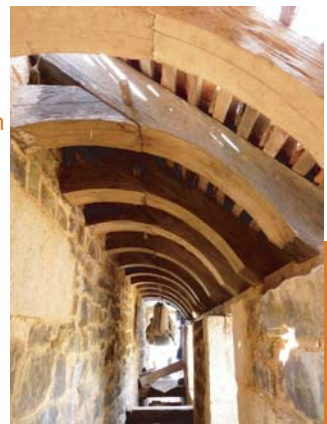

Couverture de la galerie



Porte menant à la latrine

