n°43, 29 septembre 2016
la lettre d'informations de Guédelon

château en vue...

vue de la façade nord en juillet 2016

Photo © Denis Gliksman

le pont est terminé !

Ce pont évoqué lors de notre dernier numéro de *Château en vue !* a été terminé le **10 août** dernier.

Les premiers "usagers" de ce pont furent les chevaux du chantier, qui ont dû s'habituer, d'abord en main, puis ensuite attelés, à passer ce nouveau pont qui se trouve à 3,50 m au dessus du sol.

la coupole se ferme...

Cette coupole va couvrir la salle du 1er étage de la tour d'angle à l'ouest. A la différence de sa "jumelle" à l'est qui possède un occulus, cette coupole sera entièrement fermée et supportera le sol du pigeonnier. Du fait de son rayon plus important que l'autre coupole,

les dalles, maçonnées sans coffrage, sur chant, (cf *Château en vue !* N°42), sont posées quasi verticalement et soutenues par de simples perches en bois.

Les maçons ont également commencé l'implantation de la porte reliant la courtine ouest à la tour.

© SAS Guédelon. Septembre 2016. Toute reproduction (photos et textes) est interdite sans autorisation préalable : delphine.bourselot@guedelon.fr Photos : D. Gliksman, C. Guérard, Guédelon.

la tour de la chapelle s'élance vers le ciel...

Les échafaudages sur boulins ont été remontés d'un niveau sur la tour de la chapelle projettant celle-ci à 15 m (sa hauteur définitive au niveau des maçonneries étant de 17 m).

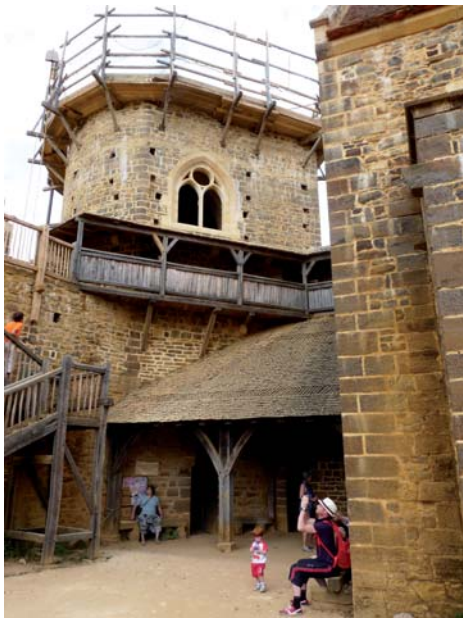

Les maçons sont en train de réaliser les 9 créneaux et merlons qui courronneront la plateforme défensive de cette tour. 3 merlons (parties pleines) sont déjà maçonnés et indiquent la hauteur définitive de la tour à 17 m. La saison prochaine, bel objectif pour les bûcherons et les charpentiers qui tailleront et assembleront la charpente en poivrière.

un nouveau bâtiment a été assemblé près du moulin

Vous avez peut-être eu l'occasion cette saison de rencontrer les charpentiers qui taillaient les éléments de ce nouvel atelier près du moulin.

L'ossature et les fermes ont été levées la semaine dernière. Le toit sera couvert en tavaillons (= tuiles en bois) d'ici la fin de saison puis les soubassements de murs seront maçonnés à l'aide de briques en terre crue qui ont été moulées sur le chantier.
Cet atelier, destiné aux charpentiers et aux meuniers, servira d'atelier de "maintenance" pour la fabrication ou la réparation de certaines pièces du moulin.

on frappe monnaie à guédelon

Nicolas a commencé sa fabrication de deniers médiévaux au mois d'août dans la cour du château.

Bien plus que la "simple" frappe de monnaie, c'est une mine d'informations sur la monnaie médiévale, sa valeur, l'organisation des ateliers, la fabrication de l'alliage monétaire, la mise en forme des flancs monétaires... que Nicolas dévoile devant des visiteurs très intéressés !

Retrouvez toutes les dates de fabrication de monnaie sur :
www.guedelon.fr rubrique **l'actualité**

à ne pas manquer durant les vacances de la toussaint

Hormis, l'activité "normale" du chantier et la poursuite des travaux, **plusieurs événements auront lieu avant la pause hivernale** :

samedi 22 octobre

* Nicolas, Mathieu et Philippe, les forgerons, **produisent du fer** à partir du minerai
* Gary **tourne de la vaisselle en bois** sur un tour à perche
* Max **pétrit et cuit le pain** dans la cuisine du château

dimanche 23 octobre

* Véronique et Dominique **cuisent poteries et canalisations** en terre
* Gary **tourne de la vaisselle en bois** sur un tour à perche
* Max **pétrit et cuit le pain** dans la cuisine du château

samedi 29 octobre

* Bruno et Florian **cuisent tuiles et carreaux de pavement** pour le château
* Max **pétrit et cuit le pain** dans la cuisine du château

dimanche 30 octobre et lundi 1er novembre

* Max **pétrit et cuit le pain** dans la cuisine du château

toutes les infos sur www.guedelon.fr
